



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria  
13/JUN/2023

<b>Município</b> Aratuípe	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Aratuípe	<b>Responsável</b> Antônio Marcos Araújo de Souza
<b>Contato</b> Gabriel Coelho Andrade	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 24/21	<b>Processo</b> 069.1486.2022.0003519-44	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.297.293,27	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 378.815,38

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (um milhão e duzentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,41	3.558,14	52,84%	20.200,24	10.291,55	50,95%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	94.559,81	25.587,52	27,06%	438.233,70	438.233,70	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	59.830,35		0,00%	269.205,40	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.499,64		0,00%	70.489,91	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	77.342,02	103.091,11	133,29%	161.802,61	103.091,11	63,71%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	42.158,17	48.378,70	114,76%	84.316,34	48.378,70	57,38%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.795,94		0,00%	101.591,88	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO			0,00%	96.709,62	0,00	0,00%
PAISAGISMO	20.841,96		0,00%	34.736,60	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.054,08		0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL	0,00		0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>378.815,38</b>	<b>180.615,47</b>	<b>47,68%</b>	<b>1.297.293,27</b>	<b>605.514,70</b>	<b>46,68%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 24/21, no valor de R\$ 378.815,38 (trezentos e setenta e oito mil oitocentos e quinze reais e trinta e oito centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 26/JUN/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Manuel Berléto Bispo Ramos  
Especialista Técnico Nível D  
Projeto FLEM/SUDESB

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0




**NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO**

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio 24/21.

Foto 01 – Vista do quiosque em construção.



Foto 02 – Vista interna dos vestiários em construção.

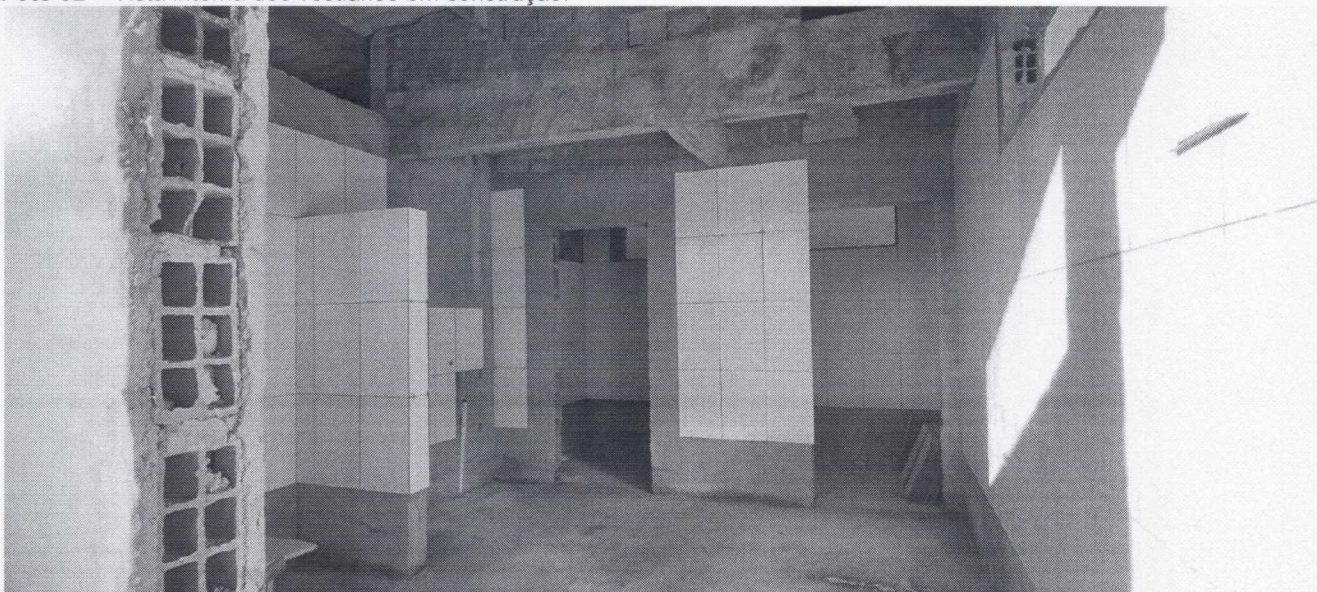

Manuel Benedito Bispo Ramos  
Especialista Técnico Nivel D  
Projeto FLEM/SUDES B



Foto 03 – Vista do poço Perfurado.


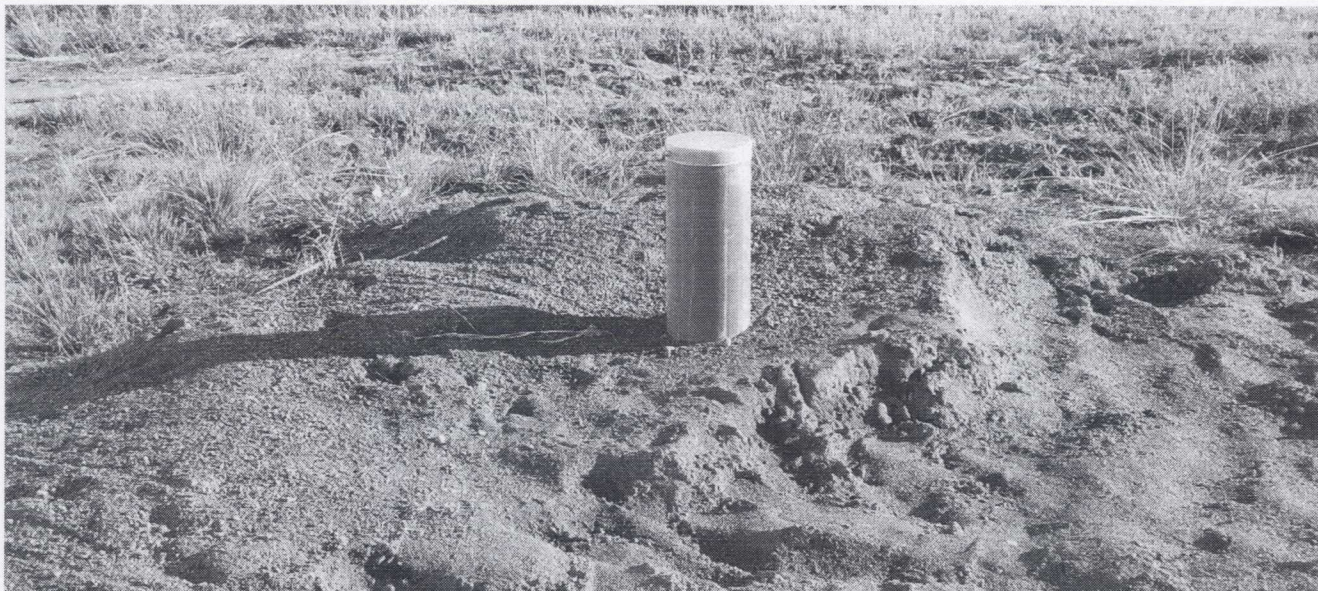


Foto 04 – Vista externa dos vestiários.

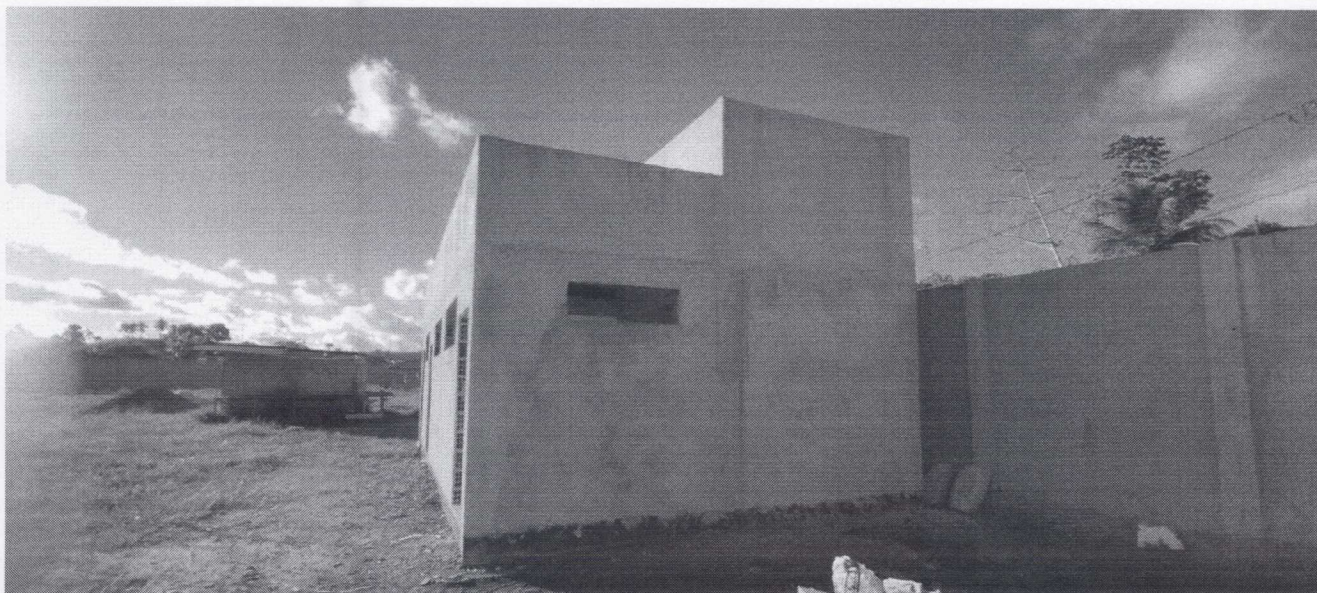

*MB*  
**Manuel Benedito Bispo Ramos**  
**Especialista Técnico Nivel D**  
**Projeto FLEM/SUDES B**

*Antonio*  
**Antônio Bentes**  
**Coordenador de Obras**  
**Cad. de Obr. 107 2**  
**CRU Nº 12273-0**
