



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
04/03/2024

Município Bonito	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Bonito	Responsável Reinan Cedro de Oliveira
Contato Oldegar Martins de Souza	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 28/22	Processo 069.1479.2022.0000876-31	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 4ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/05/22		Valor do Convênio R\$ 919.694,71	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 477.064,66

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Bonito, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Bonito, objeto do convênio nº 28/22 no valor de R\$ 919.694,71 (novecentos e dezenove mil e seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	45.682,56	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00%	77.870,93	77.870,93	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,00	0,00	0,00%	14.902,28	14.902,28	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M DE REDE DE PROTEÇÃO	162.280,67	162.280,67	100,00%	324.561,34	324.561,34	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL	164.734,89	164.734,89	100,00%	329.469,78	329.469,78	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	87.963,12	87.963,12	100,00%	87.963,12	87.963,12	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	27.369,70	27.369,70	100,00%	27.369,70	27.369,70	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	11.875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	477.064,66	477.064,66	100,00%	919.694,71	919.694,71	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 28/22, no valor de R\$ 477.064,66 (quatrocentos e setenta e sete mil, sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Responsável CARLOS A.C. OLIVEIRA.	Cargo / CREA/Cadastro ANALISTA TECNICO	Data do Relatório 05/03/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDESB

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bonito, Convênio 28/22.

Foto 01 – Execução do sistema de iluminação, e instalação do gramado sintético.



FOTO 02 – ALAMBRADO COM REDE DE PROTEÇÃO.



Handwritten signature

Handwritten signature

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bonito, Convênio 28/22.

FOTO 03 – POTÃO.



FOTO 04 – TRAVES INSTALADAS.



Handwritten signature


Handwritten initials 'P'

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Bonito, Convênio 28/22.

Foto 06 –POSTES COM REFLETORES.



Foto 06 – TOTEM.

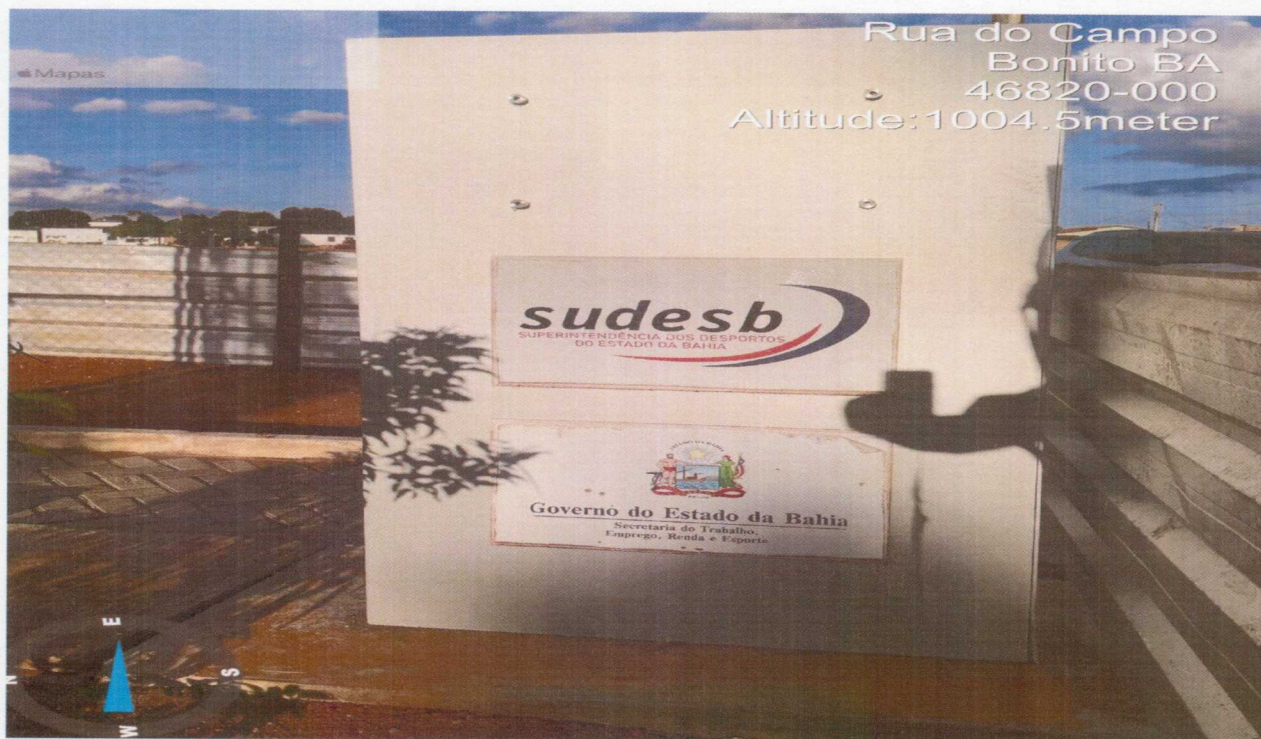

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
