



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/05

Data da Vistoria
22/09/2023

Município
Jaguaguara

Assunto
Vistoria de Convênio

Interessado
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VALE DO JIQUIRICÁ – CDSVJ (CONVALE)

Responsável
Antonio Dannilo Italiano de Almeida
(Presidente do Consorcio CONVALE)

Contato Flávio Gondim Oliva Santana

Cargo Engenheiro

Objeto Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim no Município de Jaguaguara / Ba

Endereço Sede do Município

Convênio 32/22	Processo 069.1475.2022.0001138-96	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/05/2023		Valor do Convênio R\$ 2.661.245,20	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 857.718,12

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de jaguaguara, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim, município de jaguaguara, objeto do convênio nº 32/22 no valor de R\$ 2.661.245,20 (dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.114,94		0,00%	39.344,80	26.229,86	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	28.902,41	28.902,41	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			#DIV/0!	80.465,10	80.465,10	100,00%
RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO COM ALTURA	145.113,58	145.113,58	100,00%	290.227,16	290.227,16	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO			#DIV/0!	86.810,85	86.810,85	100,00%
RECUPERAÇÃO DE VESTIÁRIOS EXISTENTE			#DIV/0!	83.968,70	83.968,70	100,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	57.048,31	57.048,31	100,00%	171.144,93	171.144,93	100,00%
PINTURA DO MURO				73.229,60	73.229,60	100,00%
RECUPERAÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL	29.864,15	29.864,15	100,00%	89.592,45	89.592,45	100,00%
RECUPERAÇÃO DA TRIBUNA DE IMPRENSA			#DIV/0!	20.142,40	20.142,41	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE DOIS QUIOSQUE - 5X5M			#DIV/0!	41.762,52	41.762,52	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	87.077,14	43.077,00	#VALOR!	174.154,28	130.615,68	75,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICAS DE CAMPO DE FUTEBOL 100X60M	478.000,00	478.000,00	100,00%	1.434.000,00	1.434.000,00	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	35.625,00	35.625,00	100,00%	35.625,00	35.625,00	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	11.875,00	5937,50	50,00%	11.875,00	5937,50	50,00%
TOTAL	857.718,12	789.321,54	92,03%	2.661.245,20	2.598.654,17	97,65%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 3ª parcela do convênio nº 32/22, no valor de R\$ 857.718,12 (oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dezoito reais e doze centavos).

Responsável: Carlos A.C Oliveira

Cargo / Analista Técnico.

Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes

Cargo / CREA/Cadastro
Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9

Data do Relatório
25/09/2023

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES

Luiz Antonio Brantes
Coord. de Obras/SUDES
CAD: 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Foto 01 – Instalação do Alambrado.



Foto 02 – Instalação da grama sintética e pavimentação.



Assinatura manuscrita

Assinatura manuscrita

Foto 03 - recuperação do vestiário.

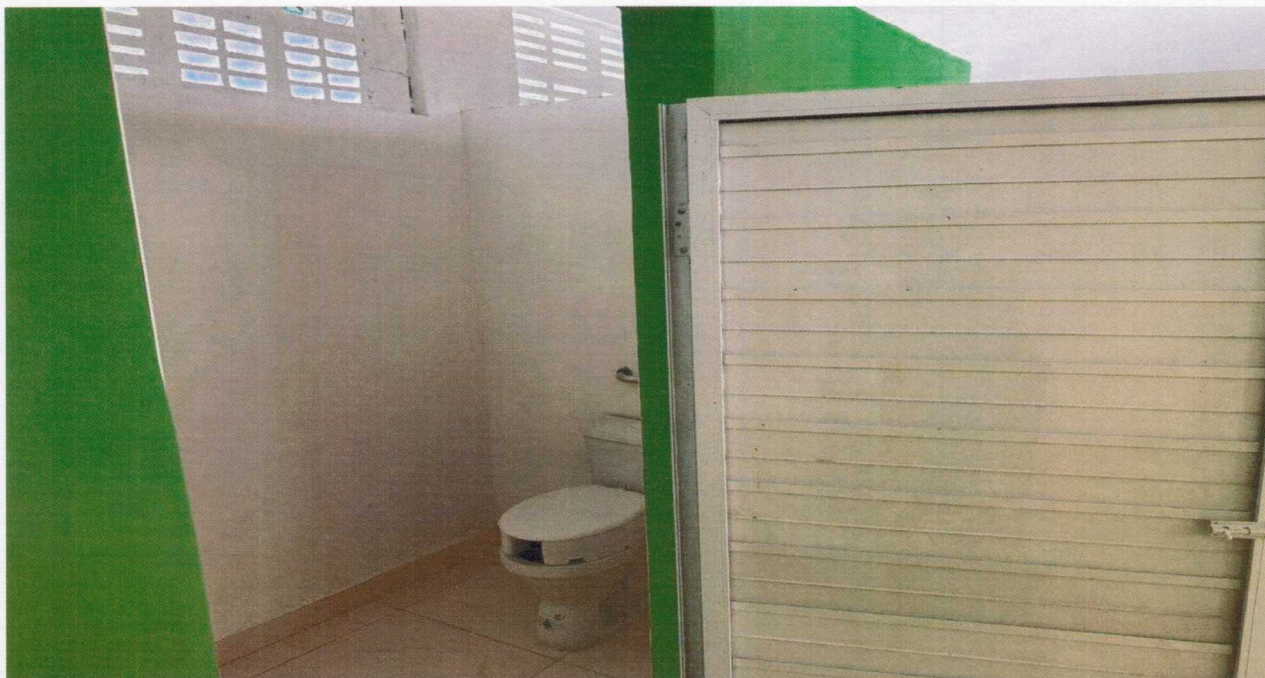


Foto 04 – arquibancada e muro.



bsouza

P

Foto 05 – parque infantil.



Foto 06 – implantação dos dois quiosques.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FOTO 07 – TRIBUNA DE IMPRENSA.



FOTO 07 -TOTEM.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
