



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria
11/MAI/23

Município Nordestina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nordestina	Responsável Eliete de Andrade Araujo
Contato Juarez Cardoso Neves	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 49/22	Processo 069.1475.2022.0001902-97	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio R\$ 1.194.711,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 390.762,11

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nordestina, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal, município de Nordestina, objeto do convênio nº 49/22 no valor de R\$ 1.194.711,79 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e setecentos e onze reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.455,06	3.455,06	100,00%	10.365,20	3.455,06	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	18.486,82	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	103.133,02	23.294,00	22,59%	309.399,06	23.294,00	7,53%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M	42.477,79	19.743,86	46,48%	84.955,59	62.221,65	73,24%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.164,99	109.164,99	122,43%	267.494,96	198.329,98	74,14%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.531,62	51.224,20	120,44%	127.594,86	102.448,40	80,29%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.514,62	101.982,20	155,66%	196.543,86	145.628,87	74,09%
COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ENTORNO	44.485,00	54.900,20	123,41%	88.970,00	103.385,20	116,20%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00%	79.026,44	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	390.762,11	363.764,51	93,09%	1.194.711,79	638.763,16	53,47%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 49/22, no valor de R\$ 390.762,11 (trezentos e noventa mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 12/mai/23
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º 12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 01 – Construção de vestiário, tipo c4.



Foto 02 – Construção de sanitário público.




NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 03 – Construção da arquibancada.



Foto 04 – Complementação do muro de entorno.

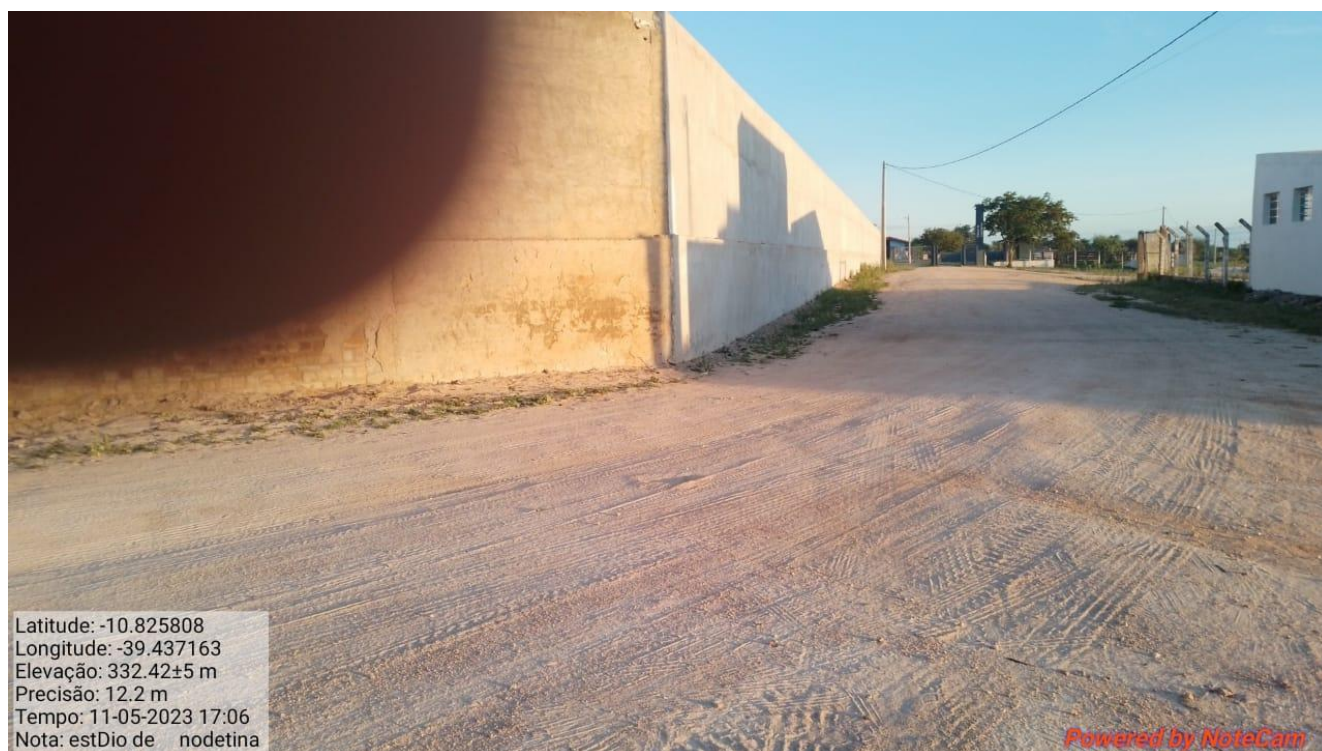

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 05 – Vista do poço perfurado para irrigação do gramado.



Adriante
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0
