



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria  
06/MAR/2024

<b>Município</b> Nordestina	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Nordestina	<b>Responsável</b> Eliete de Andrade Araujo
<b>Contato</b> Juarez Cardoso Neves	<b>Cargo</b> Engenheiro
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio Municipal	
<b>Endereço</b> Sede do Município	

<b>Convênio</b> 49/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001902-97 069.1474.2023.0005945-88	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 4º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/05/2022 e 21/12/2023		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.657.926,88	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 390.762,11

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Nordestina, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal, município de Nordestina, objeto do convênio nº 49/22 no valor de R\$ 1.657.926,88 (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.  
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.455,06	3.455,06	100,00%	10.365,20	6.910,12	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/O!	18.486,82	18.486,82	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E OSMOSE REVERSA	103.133,02	23.294,00	22,59%	772.614,15	23.294,00	3,01%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M	42.477,79	12.129,40	28,55%	84.955,59	74.351,05	87,52%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.164,99	133.384,94	149,59%	267.494,96	230.329,98	86,11%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.531,62	51.224,20	120,44%	127.594,86	102.448,40	80,29%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.514,62	101.982,20	155,66%	196.543,86	145.628,87	74,09%
COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ENTORNO	44.485,00	40.485,00	91,01%	88.970,00	88.970,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00%	79.026,44	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	390.762,11	365.954,80	93,65%	1.657.926,88	690.419,24	41,64%

**Nota:**

1. Firmado e Publicado o 4º Termo Aditivo ao Convênio 49/22, conforme processo SEI nº 069.1486.2023.0005945-88, publicado no Diário Oficial de 21 Dez. 2023, Valor Acrescido a 3ª parcela R\$ 463.215,09 (quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e quinze reais e nove centavos), para custear a implantação da Osmose Reversa.
2. O valor percentual total do item Implantação de gramado foi alterado em função do acréscimo correspondente ao aditivo.

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 49/22, no valor de R\$ 390.762,11 (trezentos e noventa mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

<b>Técnico responsável pela Vistoria.</b> Manuel Benedito Bispo Ramos Especialista Técnico MTD Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Projeto FLEM/SUDESB Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 11 de Março de 2024.
---	---	--

Luiz Antonio Almeida Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 01 – Vista da atual entrada do Estádio.



Foto 02 – Vista Externa dos Vestários.




Handwritten blue ink marks, including a stylized signature and a checkmark-like symbol.

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 03 – Vista Interna dos vestiários.



Foto 04 – Vista externa do Sanitário Público.

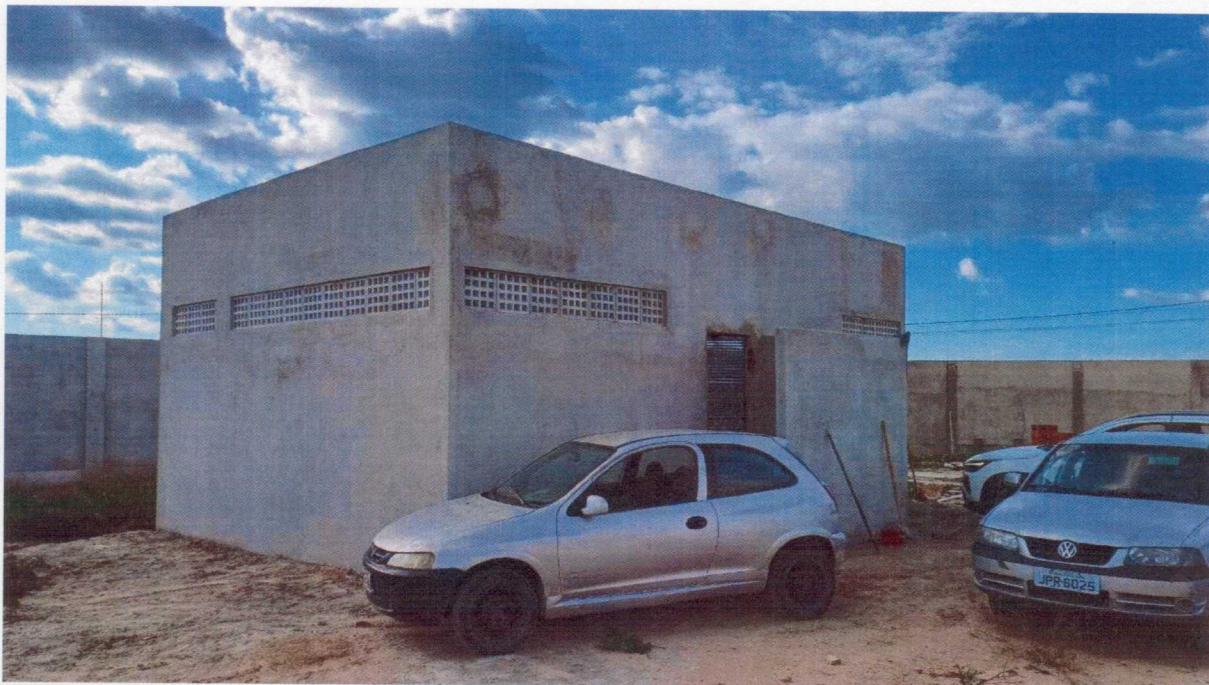

*[Handwritten signature]*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.**

Foto 05 – Vista Interna do Sanitário Público.

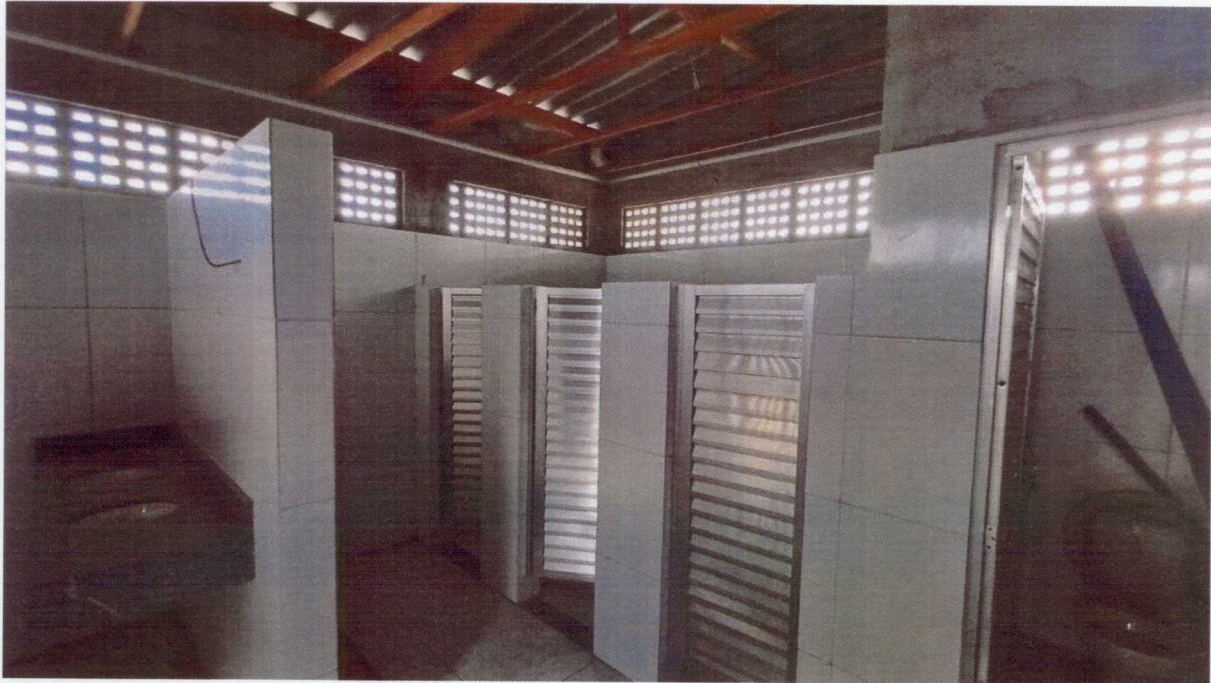


Foto 06 – Vista da Arquibancada e Postes do sistema de iluminação.



Handwritten signature and a small diagram or mark.
