



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
14/12/2023

Município Cravolândia	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cravolândia	Responsável Ivete Soares Teixeira Araújo
Contato Vinicius Corbiniano Monteiro Lemos	Cargo Engenheiro
Objeto Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo	

Endereço
Sede do Município

Convênio 09/22	Processo 069.1479.2022.0000436-92	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 26/02/22		Valor do Convênio R\$ 1.091.243,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 330.781,65

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Cravolândia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, município de Cravolândia, objeto do convênio nº 09/22 no valor de R\$ 1.091.243,79 (um milhão e noventa e um mil e duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) Obra finalizada.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.613,76	7.613,76	100,00%	22.841,28	22.841,28	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				25.227,59	25.227,59	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM COMPRIMENTO DE 163,00M E ALTURA DE 2,40M	109195,73	109.195,73	100,00%	181.992,89	181.992,89	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	51.004,76	51.004,76	100,00%	255.023,79	255.023,79	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL				299.864,06	299.864,06	100,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	91997,09	91.997,09	100,00%	183.994,18	183.994,18	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS				31.631,25	31.631,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	59095,31	59095,31	100,00%	78.793,75	78.793,75	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	11875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	330.781,65	330.781,65	100,00%	1.091.243,79	1.091.243,79	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 09/22, no valor de R\$ 330.781,65 (Trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Cargo Analista Técnico	Data do Relatório 15/12/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDESB

Claudio Jorge F. Bragança

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.

Foto 01 – Vista do vestiário



Foto 02 – Vista dos refletores



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal de Futebol Paulo de Argolo, Município de Cravolândia,
Convênio 09/22.

FOTO 03 – Vista do vestiário



FOTO 04 – Vista do sanitário

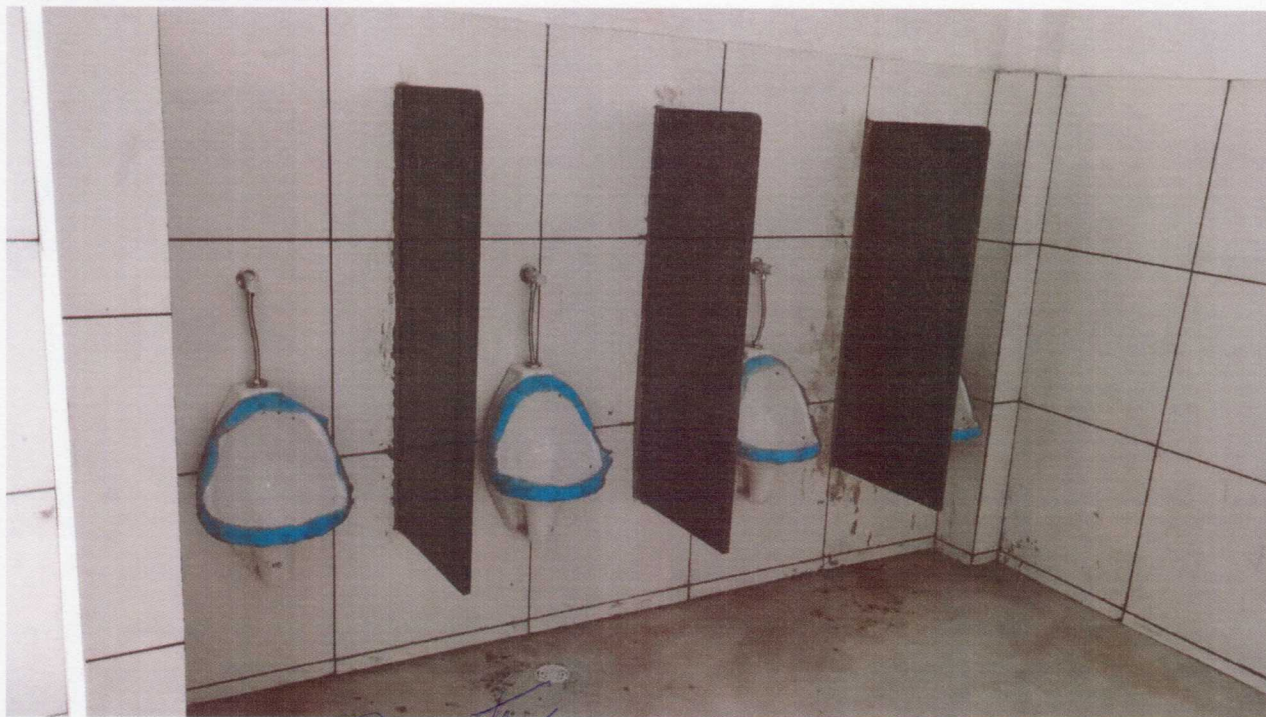

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

[Handwritten signature]
