



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
12/12/2022

Município Jaguaquara	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Jiquiriçá – CDSVJ (CONVALE)	Responsável Antônio Dannilo Italiano de Almeida (Presidente do Consórcio CONVALE)
Contato Flávio Gondim Oliva Santana	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim no Município de Jaguaquara/ Ba

Endereço
Sede do Município de Jaguaquara/ Ba

Convênio 32/22	Processo 069.1475.2022.0001138-96	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 11/05/2022		Valor do Convênio 2.661.245,20	Valor da Parcela Vistoriada 910.300,96

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Jaguaquara, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim, município de Jaguaquara, objeto do convênio nº 32/22 no valor de R\$ 2.661.245,20 (dois milhões e seiscentos e sessenta e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.114,93	13.114,93	100,00%	39.344,80	13.114,93	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	28.902,41	28.902,41	100,00%	28.902,41	28.902,41	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	80.465,10	80.465,10	100,00%	80.465,10	80.465,10	100,00%
RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO COM ALTURA TOTAL DE 2,40M	0,00	144.133,08	100,00%	290.227,16	144.133,08	49,66%
CONSTRUÇÃO DE MURO COM COMPRIMENTO DE 50,00M COM ALTURA DE 2,00M	86.810,85	0,00	0,00%	86.810,85	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DOS VESTIÁRIOS	41.984,35	0,00	0,00%	83.968,70	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	57.048,31	132.178,59	231,70%	171.144,93	132.178,59	77,23%
PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO DO ESTÁDIO COM COMPRIMENTO DE 630M E ALTURA DE 3,00M	73.229,60	0,00	0,00%	73.229,60	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PARQUE INFANTIL	29.864,15	0,00	0,00%	89.592,45	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DA TRIBUNA DE IMPRENSA	0,00	0,00	0,00%	20.142,40	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE DOIS QUIOSQUE - 5X5M	20881,26	0,00	0,00%	41.762,52	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	0,00	56.813,04	0,00%	174.154,28	56.813,04	32,62%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA EM CAMPO DE FUTEBOL 100X60M	478000,00	459520,00	96,13%	1.434.000,00	459.520,00	32,04%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	35.625,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	910.300,96	915.127,15	100,53%	2.661.245,20	915.127,15	34,39%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 32/22, no valor de R\$ 910.300,96 (novecentos e dez mil e trezentos reais e noventa e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 27/12/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras
Cad. CAU nº 12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim, Município de Jaguaquara, Convênio 32/22.

Foto 01 – Recuperação da arquibancada e do alambrado existentes.

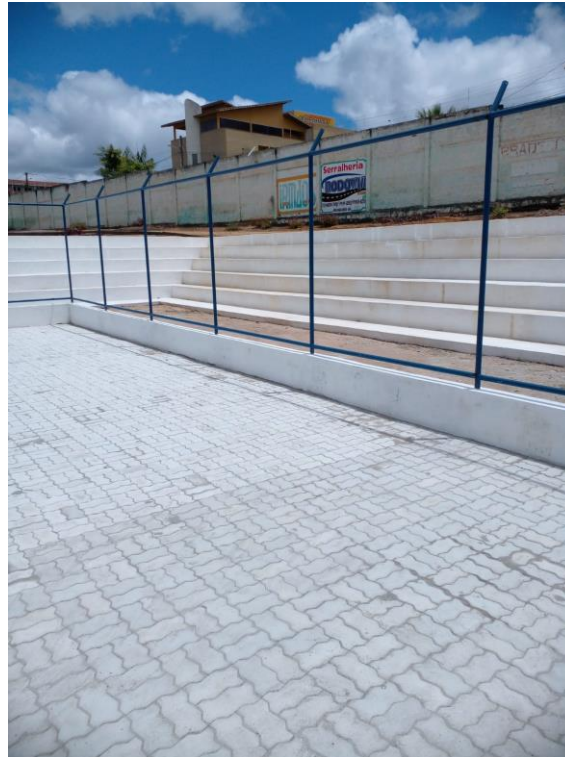


Foto 02 – Recuperação da arquibancada e do alambrado existentes.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Menandro Minahim, Município de Jaguaquara, Convênio 32/22.

Foto 03 – Execução de pavimentação.



Foto 04 – Execução de grama sintética.



Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0
